

Задание 1. Вопросы к заказчику и стейкхолдерам

Проект «ABS Inventory & Procurement Assistant»

Вопрос 1

Вопрос	Какие товары и категории должны войти в MVP: все расходные материалы SPA или ограниченный набор категорий/SKU? Есть ли категории, для которых действуют разные правила учёта, расхода или закупки?
Кому	Заказчику и управляющему SPA.
Зачем	Зафиксировать границы пилота и понять, можно ли использовать единую модель учёта и расчёта для всей номенклатуры.
Какой риск закрываем	Разрастание объёма MVP, неверная оценка трудоёмкости и применение одной бизнес-логики к товарам с разными правилами.

Вопрос 2

Вопрос	Как устроена складская и закупочная структура: единый центральный склад, отдельные склады по объектам/филиалам или смешанная схема? На каком уровне должна рассчитываться потребность и формироваться план закупок?
Кому	Заказчику, управляющему сети и специалисту по закупкам.
Зачем	Определить уровень агрегации остатков, потребности и закупок и необходимость учитывать различия между объектами.
Какой риск закрываем	Неверное объединение потребностей филиалов, некорректные остатки и закупочные рекомендации.

Вопрос 3

Вопрос	Как сейчас организован процесс управления запасами и закупками в сети: какие роли участвуют в определении потребности, согласовании и размещении заказа, и какие решения принимаются на уровне отдельного SPA, а какие централизованно? Какие из этих действий должен поддерживать MVP?
Кому	Управляющему SPA, специалисту по закупкам, администратору склада и финансовому менеджеру.
Зачем	Понять реальный AS IS-процесс, распределение ответственности и границы автоматизации в MVP.
Какой риск закрываем	Неверное понимание процесса сети, ролей и точек принятия решений, из-за чего MVP может не встроиться в реальную работу.

Вопрос 4

Вопрос	В каких системах или файлах сейчас хранятся данные об остатках, движении, закупках, ценах, поставщиках, сроках годности и загрузке? Какие из необходимых данных уже доступны в ABS, каких не хватает, кто отвечает за их актуальность и каким способом данные должны попадать в MVP?
Кому	ИТ-команде ABS, администратору склада, специалисту по закупкам и заказчику.
Зачем	Определить источники данных, наличие нужных полей в ABS, способ загрузки или интеграции и ответственность за качество данных.
Какой риск закрываем	Расчёты могут опираться на неполные, устаревшие или отсутствующие в ABS данные.

Вопрос 5

Вопрос	Что должно считаться доступным остатком: только товар на складе или также материалы, переданные в кабинеты/мастерам? Как фиксируется расход и остаток частично использованных материалов, например открытого масла или крема?
Кому	Управляющему SPA и администратору склада.
Зачем	Определить единые правила расчёта фактического доступного запаса.
Какой риск закрываем	Системный остаток может расходиться с фактическим, из-за чего искажаются прогноз потребности и закупка.

Вопрос 6

Вопрос	На каких данных должен строиться прогноз потребности: историческом фактическом расходе, нормативном расходе на процедуру, плановом количестве процедур/загрузке или их комбинации? Что является приоритетным при расхождении нормативного и фактического расхода?
Кому	Заказчику, управляющему SPA и финансовому менеджеру.
Зачем	Формализовать ключевую расчётную логику прогнозирования.
Какой риск закрываем	Разные трактовки одной и той же потребности дадут разные объёмы закупки и бюджет.

Вопрос 7

Вопрос	Что в бизнесе считается сезонностью, какие периоды или события её определяют, должна ли система выявлять её по истории или пользователь задаёт её вручную? Можно ли корректировать сезонные периоды и по каким правилам сезонность влияет на прогноз потребления?
Кому	Заказчику и управляющему SPA.
Зачем	Определить бизнес-правила учёта сезонных колебаний спроса и загрузки.
Какой риск закрываем	Неверная сезонная корректировка исказит прогноз расхода, объём закупки, бюджет и предупреждения о дефиците или излишке.

Вопрос 8

Вопрос	Как определяются минимальный и страховой запас, избыточный остаток и точка заказа для каждой позиции? Какой срок поставки использовать при расчёте даты заказа: норматив поставщика или историю фактических поставок и отклонений?
Кому	Заказчику, специалисту по закупкам и управляющему SPA.
Зачем	Зафиксировать правила, по которым система должна предупреждать о риске и заранее рекомендовать заказ.

Какой риск закрываем	Слишком поздние или слишком ранние рекомендации, ложные предупреждения, дефицит либо излишний запас.
-----------------------------	--

Вопрос 9


Вопрос	Как открытые заказы и их статусы должны влиять на новую потребность: какие статусы считать гарантированным пополнением, как учитывать ожидаемую дату поставки и что делать, если заказ задерживается?
Кому	Специалисту по закупкам и управляющему SPA.
Зачем	Не допустить повторной закупки уже заказанного товара и одновременно учитывать риск задержки поставки.
Какой риск закрываем	Дублирование заказов либо дефицит из-за формального учёта поставки, которая не успевает к моменту исчерпания запаса.

Вопрос 10

Вопрос	Как срок годности должен влиять на рекомендуемый объём закупки и использование остатков? По какому правилу выбирается партия для расхода и за сколько времени до окончания срока годности система должна считать её рискованной?
Кому	Управляющему SPA, администратору склада и специалисту по закупкам.
Зачем	Связать закупочную рекомендацию с партиями и предотвращением списаний.
Какой риск закрываем	Закупка объёма, который не успеют использовать, либо позднее предупреждение о риске списания.

Задание 2. Ключевой бизнес-процесс

User Flow: выявление риска дефицита и формирование рекомендации на закупку

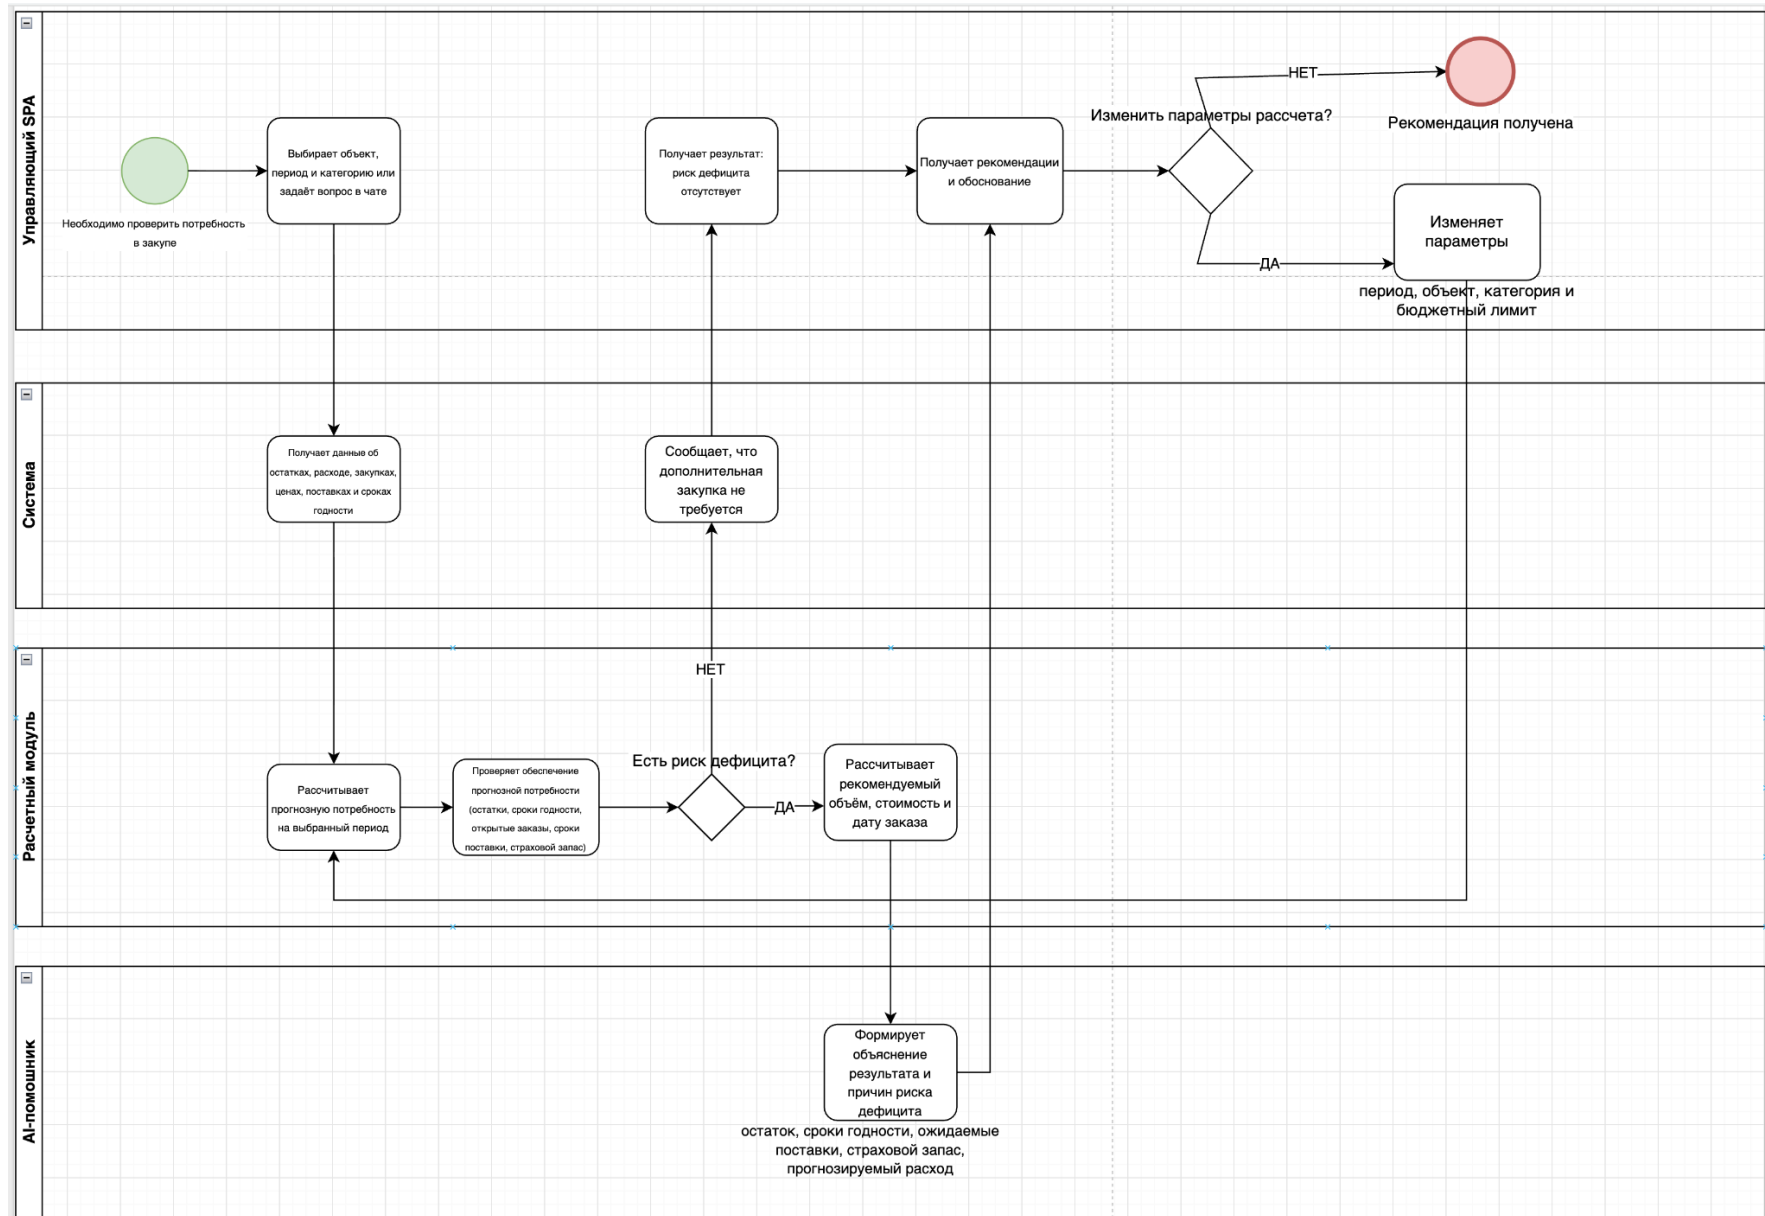

Запрос → расчёт потребности → проверка риска → рекомендация и объяснение → изменение параметров → повторный расчёт.

Задание 3. Дорожная карта пилота на 2 месяца

Период	Веха	Основные работы	Критерий готовности / результат	Кто вовлечён
Неделя 1	1. Discovery и уточнение требований	Встречи с заказчиком и ключевыми стейкхолдерами; уточнение AS IS; закрытие критичных пробелов БТ; определение источников и доступности данных; уточнение бизнес-правил расчётов; определение границ MVP.	Согласованы score и ключевые требования MVP, подтверждены необходимые данные и основные бизнес-правила.	PM/BA, заказчик, управляющий SPA, склад, закупки, финансы, ИТ ABS
Неделя 2	2. Планирование и проектирование MVP	Kickoff с командой; декомпозиция требований; формирование и приоритизация backlog; распределение ответственности; проектирование модели данных и расчётной логики; определение архитектуры и плана реализации.	Сформирован приоритизированный backlog, определены модель данных и логика расчётов, команда готова к реализации MVP.	PM/BA, Tech Lead, Backend, AI/ML, QA, ИТ ABS
Недели 3–4	3. Разработка основного функционала MVP	Подготовка и подключение необходимых данных; разработка расчётного модуля; прогнозирование потребности и проверка основных рисков; подключение LLM для интерпретации запросов и объяснения результатов; первичная проверка расчётов.	Работает основной контур MVP: данные → расчёты → формирование понятного ответа пользователю.	Backend, AI/ML, Tech Lead, QA, PM/BA
Недели 5–6	4. Интеграция и сборка MVP	Объединение расчётного модуля, LLM и выбранного пользовательского интерфейса; взаимодействие пользователя с системой: запрос, получение рекомендации, изменение параметров и повторный расчёт; отображение исходных показателей; промежуточное demo.	Собрана рабочая версия MVP, пользователь может пройти основной сценарий от запроса до получения и корректировки рекомендации.	Backend, AI/ML, QA, PM/BA, ИТ ABS, заказчик
Недели 7–8	5. Тестирование и завершение пилота	Функциональное и интеграционное тестирование; проверка корректности расчётов и AI-ответов; исправление критичных дефектов; доработка по обратной связи; финальное demo и фиксация результатов пилота.	MVP протестирован, критичные замечания устранены, результаты пилота представлены заказчику и определены дальнейшие шаги.	QA, Backend, AI/ML, PM/BA, заказчик, ключевые пользователи

Ключевые риски пилота

Риск	Возможное влияние	Как предусматриваем
Недостаточное качество или доступность исходных данных	Неполные или несогласованные данные могут привести к некорректным расчётам и рекомендациям.	На Discovery проверить источники, состав и качество данных; при необходимости использовать подготовленный тестовый набор.
Некорректные расчёты или интерпретация результата AI-помощником	Пользователь может получить неверную или вводящую в заблуждение рекомендацию.	Отдельно тестировать детерминированные расчёты на контрольных примерах и проверять AI-ответы на соответствие результатам; показывать исходные показатели.

Задание 4. Контрольные сценарии и метрики приёмки

Контрольный сценарий 1. Выявление риска дефицита на ближайшие 14 дней

Что измеряем	Корректность определения позиций с риском дефицита.
Как измеряем	Сравниваем результат MVP на подготовленном наборе данных с ожидаемым результатом, рассчитанным по согласованным бизнес-правилам.
На каких данных	Данные по выбранным SKU: остатки, расход, открытые заказы и сроки поставки.
Порог приёмки	Требуется согласования с заказчиком. Для детерминированных расчётов на контрольных кейсах ожидается совпадение с эталонным расчётом.

Контрольный сценарий 2. Расчёт рекомендации на закупку

Что измеряем	Корректность рекомендуемого объёма закупки, даты заказа и стоимости.
Как измеряем	Для контрольных SKU заранее рассчитываем ожидаемый результат по согласованным формулам и сравниваем его с расчётом MVP. Проверяем, что система учитывает остаток, прогнозный расход, открытые заказы, срок поставки и применяемый страховой запас.
На каких данных	Контрольный набор по SKU: текущий остаток, прогнозный расход, открытые заказы, сроки поставки, закупочная цена и параметры страхового запаса.
Критерий приёмки	На контрольных кейсах объём, дата и стоимость закупки совпадают с эталонным расчётом по согласованным бизнес-правилам.

Контрольный сценарий 3. Формирование плана и бюджета закупок

Что измеряем	Корректность плана закупок и рассчитанного бюджета на выбранный период.
Как измеряем	Формируем план на контрольный период и сравниваем итоговые суммы и разбивку по месяцам, категориям и товарам с эталонным расчётом. Дополнительно проверяем пересчёт при изменении периода или бюджетного лимита.
На каких данных	История расхода и закупок, текущие цены, прогноз потребности, открытые поставки и выбранный период; при наличии — установленный бюджетный лимит.

Критерий приёмки	Итоговый бюджет и его детализация соответствуют эталонному расчёту, а изменение параметров приводит к корректному пересчёту результата.
-------------------------	---

Контрольный сценарий 4. Контроль сроков годности и риска списания

Что измеряем	Корректность выявления партий с приближающимся сроком годности и риска избыточного запаса/списания.
Как измеряем	На контрольном наборе заранее отмечаем партии, которые должны попасть в зону риска с учётом срока годности, остатка и прогнозного расхода, и сравниваем этот список с результатом MVP.
На каких данных	Партии товаров: SKU, количество в остатке, срок годности и прогнозный расход на выбранный период.
Критерий приёмки	MVP выявляет все заранее определённые контрольные партии с риском и показывает пользователю исходные показатели, на которых основан вывод.

Примечание: конкретные числовые пороги для прогнозных и AI-метрик в БТ не заданы. Их целевые значения необходимо согласовать с заказчиком на Discovery и зафиксировать в критериях приёмки.

Задание 5. Процесс работы с заказчиком и командой

Работа строится недельными спринтами. На этапе Discovery коммуникация с заказчиком и профильными стейкхолдерами проводится чаще — по необходимости для закрытия критичных вопросов. После согласования score MVP используется регулярный ритм встреч ниже.

С кем	Формат	Частота	Фокус
Команда разработки	Sprint Planning	Понедельник, начало спринта	Цель спринта, приоритетные задачи, ответственные, оценки и зависимости.
Команда разработки	Team Sync	Среда и пятница	Прогресс, блокеры, зависимости, отклонения от плана и вопросы по реализации.
Заказчик / ключевые стейкхолдеры	Weekly Sync + Demo	Пятница	Результат недели, демонстрация готового функционала, вопросы по бизнес-логике, риски, изменения требований и решения от заказчика.
Команда разработки	Retro	Пятница, после Weekly Sync	Что прошло хорошо, что мешало работе и что меняем в следующем спринте с учётом обратной связи заказчика.
Команда + заказчик	Рабочий чат	По необходимости	Срочные вопросы, блокеры и уточнения, которые нельзя откладывать до следующего sync.

Фиксация договорённостей и изменений

Ключевые решения, изменения требований, риски, ответственные и сроки фиксируются письменно после встреч. Новые требования добавляются в backlog и оцениваются по влиянию на score, сроки и приоритеты MVP. В текущий спринт изменения включаются только после согласования.
